AUFBAUPLAN · ZWEI JAHRE · EINE PERSON

Einkauf in sechs Stufen

Ein Einkauf, den es noch nicht gibt, in einem Haus, das bewusst wenig Prozess hat. Jede Stufe erzeugt, was die nächste verbraucht.

> **Die Reihenfolge ist das Argument.** Freie Hände machen die Bestandsaufnahme möglich, der Bestand macht das Reporting ehrlich, das Reporting gibt dem Prozess Rückhalt, der gelebte Prozess erzeugt den Sog bei den Einheiten, und erst das alles zusammen begründet Werkzeug und zweiten Kopf.
>
> **Eine Person mit Werkzeug schafft, wofür sonst drei nötig wären.** Aber nur, wenn das Werkzeug auf verstandene Prozesse trifft. Werkzeug auf einen Prozess zu werfen, den niemand aufgenommen hat, erzeugt schnellere Fehler.

Kein klassischer Einkauf

WEIL EIN KLASSISCHER HIER SCHEITERN WÜRDE

Ein Haus ohne Prozess, ohne Mandat, mit eigenständigen Einheiten und einer einzigen Person im Einkauf. Wer darauf das Standardmodell legt, baut eine Behörde, die niemand benutzt. Sieben Entscheidungen, die bewusst anders fallen:

KLASSISCHER EINKAUF	DIESER HIER
Beginnt mit einer Richtlinie	**Beginnt mit Zuhören und Daten.** Die Regel kommt aus dem, was ist, nicht aus einer Vorlage.
Braucht ein Mandat	**Braucht Nachfrage.** Es gibt kein Mandat und es wird keins beantragt. Wer nicht will, muss nicht.
Misst Abdeckungsgrad und Einhaltung	**Misst zurückgegebene Zeit und gehaltene Fristen.** Keine Quote, an der eine Einheit schlecht aussehen kann.
Verhandelt den Preis herunter	**Verhandelt den Gegenwert.** Ein Verlagshaus hat Inhalte, die die Anbieter wollen. Wer nur über Rabatt spricht, verschenkt die stärkere Seite.
Skaliert über Köpfe	**Skaliert über Werkzeug.** Eine Person plus Automatisierung, statt drei Personen plus Abstimmung.
Beansprucht alles	**Sagt offen, was es nicht anfasst.** Was mehr Aufwand als Nutzen bringt, läuft weiter wie bisher, und das wird ausgesprochen.
Ist ein Tor	**Ist ein Produkt.** Der Fristenkalender, die eigene Ausgabensicht, das Verhandlungsbriefing. Dinge, die benutzt werden, keine Genehmigungsstufe.

> *Governance sagt, was einer darf, und braucht ein Mandat. Transparenz sagt, was ist, und braucht nur Daten. Hier gibt es kein Mandat, also baue ich Transparenz.*

Zwei Spuren, nicht eine

DER UNTERSCHIED, AN DEM SICH ALLES ENTSCHEIDET

Die Frage „setzt ihr KI ein“ hat hier zwei verschiedene Antworten, und sie zu verwechseln ist der teuerste Fehler in diesem Plan. Beide laufen innerhalb der Freigaben, die es hier schon gibt: Legal Check, Security Check, zwei Unterschriften, auf jeden Vertrag. Daran ändert sich nichts. Die zweite Spur braucht darüber hinaus eine **zusätzliche** Freigabe, weil dort etwas dauerhaft läuft und in Systeme schreibt.

SPUR 1 · AB TAG EINS

KI als Arbeitsweise

Auf den Zugängen, die das Haus ohnehin hält, für meine eigene Arbeit. Nichts läuft dauerhaft, nichts schreibt in ein System, nichts braucht einen Betreiber.

Die bestehenden Freigaben gelten unverändert. Jeder Vertrag geht weiter durch Legal und Security und trägt zwei Unterschriften.

- Ist-Prozesse aus Gesprächen zusammenführen und gegenüberstellen
- Vertragsbestände sichten und Widersprüche zwischen Quellen finden
- Ausgabendaten normalisieren, klassifizieren, auswerten
- Verhandlungen vorbereiten, Vertragsfassungen vergleichen
- Entwürfe für Prozess, Reporting und Datenblätter

SPUR 2 · NACH FREIGABE

KI als Infrastruktur

Etwas, das ohne mich weiterläuft, in die Systeme des Hauses schreibt und einen benannten Betreiber braucht. Dafür kommt **zusätzlich** die Freigabe des Datenwegs dazu.

- Anbieter, Vertrag, Verarbeitungsort, Speicherdauer schriftlich fixiert
- Auftragsverarbeitung und Trainingsausschluss geklärt
- Security gibt die Konfiguration frei, vor dem ersten Dokument
- Ein Betreiber neben mir ist benannt
- Betrieb und Wartung sind dokumentiert

Deshalb steht in Stufe 1 keine Untätigkeit. Dort wird mit KI gearbeitet, und zwar hart. Was dort nicht passiert, ist etwas dauerhaft laufen zu lassen, bevor irgendjemand die Prozesse verstanden hat. Das ist keine Zurückhaltung, das ist die Bedingung dafür, dass Spur 2 überhaupt trägt.

Was ich an Werkzeug mitbringe

Erprobte Muster, keine fremden Instanzen

Das Prüfmuster aus meiner Sorgfaltsprüfung und das Marktbeobachtungsmuster habe ich gebaut. Übernommen wird das Muster, neu aufgesetzt in eurer Umgebung. Meine eigene Infrastruktur sieht zu

keinem Zeitpunkt eure Daten.

Die Automatisierungsplattform, die ihr schon produktiv fahrt


Kein neues Werkzeugbudget, kein zusätzlicher Anbieter, keine weitere Vertragsprüfung. Was fehlt, sind die Antworten dazu: welche Instanz, wer patcht sie, wer darf Abläufe ändern.

Methode statt Magie

Eine Warengruppenstruktur, eine Prompt-Bibliothek für Vertrags- und Datenarbeit, ein Datenblattformat für Security. Werkzeuge werden mit Fachwissen befüllt, sonst produzieren sie nur schneller Unsinn.

Der Plan auf einen Blick

ZWEI JAHRE, SECHS STUFEN, ZWEI BAHNEN

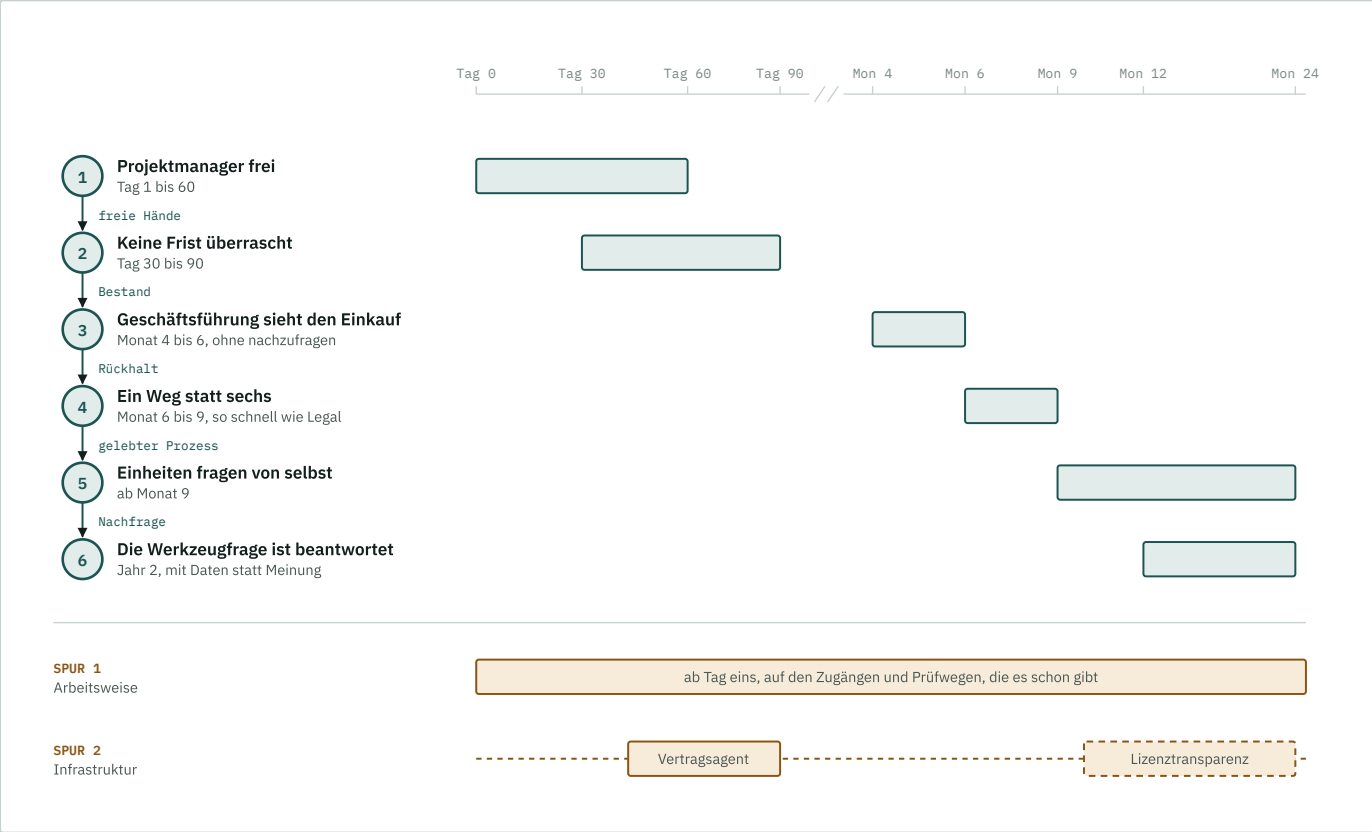

Die Stufen überlappen: die Bestandsaufnahme beginnt an Tag 30, während die Übergabe noch läuft. Beschriftet ist an jedem Pfeil, was die Stufe an die nächste übergibt. Unten die beiden KI-Bahnen: **Spur 1 läuft durchgehend** vom ersten Tag an, **Spur 2 hat genau einen gebauten Punkt** und einen zweiten, der gestrichelt gezeichnet ist, weil er möglich wird, aber nicht zugesagt ist. Die Zeitachse ist nach Tag 90 gestaucht, erkennbar am Bruch.

Die sechs Stufen im Einzelnen

WIE JEDE ERREICHT WIRD, WAS DANACH WAHR IST, WORAN MAN ES MISST

1

TAG 1 BIS 60 · DIE ERSTEN 30 TAGE SIND AUFNAHME

Verstehen, wie hier gearbeitet wird, und die Projektmanager freibekommen

- **Stakeholder-Landkarte, Woche 1 und 2.** Nicht das Organigramm, sondern die Entscheidungswege: wer entscheidet, wer zahlt, wer prüft, wer kann blockieren, und wer wird heute umgangen. Je Gesprächspartner ein Termin, ohne Agenda außer zuhören.
- **Ist-Prozesse aufnehmen.** Wie läuft heute eine Beschaffung von der Anfrage bis zur bezahlten Rechnung, je Einheit einzeln. Aufgenommen, nicht bewertet. Wo die Wege auseinanderlaufen, ist der spätere Ansatzpunkt.
- **Datenlage aufnehmen.** Was gibt es, wo liegt es, in welchem Zustand, was lässt sich exportieren und was nicht. Das ist die Voraussetzung für alles Weitere und die häufigste Stelle, an der Pläne scheitern.
- **Arbeitsweise je Einheit.** Wie kaufen sie heute ein, was haben sie selbst aufgebaut, wo fehlt ihnen etwas. Daraus entsteht, wo gezielt Werkzeug hilft und wo es stören würde.
- **Übergabe.** Ein Gespräch je Projektmanager: was gibst du zuerst ab, was willst du behalten. Zählstand am Ende von Woche 2 festhalten, sonst ist „auf null“ später nicht prüfbar.
- **Ab Woche 2 in die laufenden Verhandlungen,** zweistufig: erst als Vorbereiter und zweiter Kopf, die Führung nach dem ersten vollständigen Vertragsdurchgang.
- In dieser Phase wird nichts umgebaut. Prüfungen und Unterschriften bleiben exakt wie heute.

KI, SPUR 1 · VOLL IM EINSATZ

Die Aufnahme selbst läuft mit Werkzeug, sonst dauert sie ein halbes Jahr statt vier Wochen. **Gesprächsnotizen zu einer Prozesslandkarte verdichten**, die Abläufe der Einheiten nebeneinanderlegen und die Abweichungen herausziehen, die vorhandenen Vertragsbestände sichten und die Widersprüche zwischen den Quellen sichtbar machen, erste Ausgabendaten normalisieren und klassifizieren.

Das läuft alles auf den Zugängen des Hauses, für meine eigene Arbeit, ohne dauerhaften Betrieb. **Ergebnis nach 30 Tagen: eine belegte Beschreibung des Ist-Zustands**, aus der hervorgeht, wo Werkzeug wirklich trägt. Nicht eine Vermutung.

DANACH WAHR

Die Entscheidungswege sind bekannt, die Ist-Prozesse beschrieben, und jeder Vorgang, den ein Projektmanager abgeben wollte, liegt beim Einkauf.

GEMESSEN AN

Dem Zählstand der übernommenen Vorgänge, erhoben statt geschätzt. Und daran, dass die Prozessbeschreibung von den Beteiligten als richtig bestätigt wird.

2

TAG 30 BIS 90

Keine Frist überrascht mehr

- Entscheiden, welche der bestehenden Ablagen führt. Kriterien vorher benannt: Vollständigkeit, Fristenlogik, Pflegeaufwand. **Keine vierte Ablage.**
- Verlängerungskalender für zwölf Monate, mit Vorlauf von 90, 60 und 30 Tagen.
- Die Vertragsrollen durchgehen: je Vertrag ein Name, und der Name weiß es.

KI, SPUR 2 · HIER WIRD GEBAUT, UND NUR HIER

Der eine Agent des ersten Jahres. Er liest jeden Vertrag und zieht die Stammdaten heraus: Partner, Laufzeitende, Kündigungsfrist, automatische Verlängerung, Jahreswert, Preisanpassung. Jede Angabe trägt ihre Fundstelle, Seite und Klausel, damit die Kontrolle Sekunden dauert. Er meldet, wo die Ablagen sich widersprechen.

Und er kündigt Verlängerungen an, an die richtige Person. Er führt je Vertrag den benannten Verantwortlichen mit und meldet die Frist mit Vorlauf dorthin, nicht in einen Verteiler. Wo kein Verantwortlicher hinterlegt ist, ist genau das der erste Befund.

Er legt keine Klausel aus und empfiehlt keine Handlung. Steht eine Auslegungsfrage im Raum, lautet der einzige nächste Schritt: an Legal.

Er startet erst nach der Freigabe des Datenwegs. Bis dahin läuft die Inventur mit Spur 1, also von Hand unterstützt, statt automatisiert.

DANACH WAHR

Eine Verhandlung beginnt mit Vorlauf, nicht nach der Verlängerungsrechnung.

GEMESSEN AN

Zählstand je Ablage als Nenner. Dann vorwärts: Anteil der Verlängerungen mit mindestens 60 Tagen Vorlauf.

3

MONAT 4 BIS 6

Die Geschäftsführung sieht den Einkauf, ohne zu fragen

- Das Reporting hängt sich an die bestehenden Quartalsrunden. Kein neues Gremium, kein neues Werkzeug.
- Zweiter Takt: zur jährlichen Planungsrunde bekommt jede Gesellschaft Planungsinput statt Rückschau.
- Fünf Kennzahlen, nicht mehr. Zwei monatlich, drei quartalsweise, nichts Tägliches.

KI, SPUR 1

Der Bericht entsteht aus den Daten, die Stufe 2 erzeugt hat. Die Aufbereitung, die Textfassung je Publikum und der Quartalsvergleich laufen mit Werkzeug, die Zahlen kommen aus deterministischer Rechnung. **Keine Kennzahl wird von einem Modell berechnet.**

DANACH WAHR

Transparenz in die Geschäftsführung ist Routine statt Sonderauswertung.

GEMESSEN AN

Der Report kommt pünktlich. Der härtere Test: die Geschäftsführung benutzt ihn.

4

MONAT 6 BIS 9

Ein Weg statt sechs, und er ist so schnell wie Legal

Ohne diese Stufe läuft jeder einzelne Fall weiter durch einen Kopf. Die Stufen davor machen Verträge sichtbar und berichtsfähig, aber nicht wiederholbar. Hier wird aus „einer macht Einkauf“ ein Haus, das Einkauf hat. Ohne sie gibt es kein Skalieren, keine Vertretung und keine zweite Person, und Legal und Security werden bei jedem Fall neu gefragt, statt zu wissen, wo sie sitzen.

- **Ein gemeinsamer Weg, daran führt nichts vorbei.** Sechs verschiedene Wege für dieselbe Sache sind der Grund, warum heute nichts vergleichbar ist und jede Auswertung von vorn beginnt.
- **Und die Unterscheidung, die alles trägt:** der Prozess sagt, wie ein Vertrag durchs Haus läuft, also erfasst, geprüft, gefristet, unterschrieben. **Was gekauft wird, entscheidet weiter die Einheit.** Immer. Ein gemeinsamer Weg ist keine gemeinsame Entscheidung.
- **Ausnahmen sind eingeplant, nicht bekämpft.** Ein Weg, der keine Ausnahme kennt, wird umgangen statt gegangen. Jede Ausnahme wird notiert, und wenn sich eine häuft, ist der Weg falsch gebaut, nicht der Mensch.
- Drei Bausteine auf einer Seite: die Wertgrenze aus der tatsächlichen Verteilung, nicht erfunden. Die Unterschriftenfrage als Frage an die Geschäftsführung. Eine Freigabelogik am Rechnungsworkflow, der schon funktioniert.
- Die Messlatte setzt Legal. Ein Einkaufsschritt, der deren Rhythmus bricht, ist falsch gebaut und fliegt raus.

Verkauft wird er über das, was er zurückgibt: **zusammengeführte Daten und Verträge machen schneller und transparenter, damit aus reaktiv proaktiv wird und Zeit für die strategische Arbeit entsteht.** Nicht über eine Anweisung. Das ist derselbe Mechanismus wie beim langen Schwanz: ein Weg, den man leichter geht als den Umweg.

KI, SPUR 1

Der Prozessentwurf wird gegen die aufgenommenen Ist-Abläufe geprüft, bevor ihn jemand liest: **wo bricht der Entwurf mit dem, was heute funktioniert.** Diese Gegenprobe ist der Grund, warum der Prozess auf eine Seite passt und nicht auf zwölf.

DANACH WAHR

Verträge werden nach Regel geschlossen statt nach Person.

GEMESSEN AN

Durchlaufzeit von Bedarf bis Unterschrift. Sie darf gegen heute nicht steigen.

5

AB MONAT 9

Die Einheiten holen sich den Einkauf, nicht umgekehrt

- Je Einheit eine Potenzialliste, erhoben aus deren Bedarf, nicht abgeleitet aus einer Holding-Idee.
- Das Muster ist das, was schon funktioniert: zentral verhandelt, föderiert betrieben. Billing und Administration bleiben dezentral.
- **Kein Mandat, und keins nötig.** Wer nicht mitmacht, taucht in keinem Bericht auf, weder namentlich noch als Lücke.

KI, SPUR 2 · WIRD HIER MÖGLICH

Mit stehenden Vertragsstammdaten wird Lizenz- und Nutzungstransparenz erreichbar: gekauft, zugewiesen, aktiv genutzt, Differenz, je Einheit. **Die Einheit bekommt ihr Blatt zuerst**, und nur sie entscheidet, was davon weitergeht.

Vorher fehlt dem die Einkaufsseite zum Dagegenhalten. Ob es gebaut wird, entscheidet sich daran, ob bis dahin ein zweiter Betreiber da ist.

DANACH WAHR

Die nächsten Gruppenverträge entstehen aus Anfragen der Einheiten.

GEMESSEN AN

Anteil der Ideen, die von den Einheiten selbst kommen. Nicht an Anzahl Gesprächen.

6

JAHR ZWEI

Die Werkzeugfrage ist beantwortet, mit Daten statt mit Meinung

- **Die Werkzeugfrage wird entschieden, mit Begründung.** Der Bestand zeigt jetzt, was die vorhandenen Systeme tragen und wo es klemmt. Dann eine Auswahl mit echtem Mengengerüst, oder der begründete Verzicht. Beides ist ein gültiges Ergebnis.
- Die Gegenüberstellung liegt vor: gemanagtes Volumen, Einsparungen gegen fixierte Baseline, vermiedene automatische Verlängerungen. Grundlage für die Kapazitätsentscheidung.
- Jeder Vertrag hat einen benannten Verantwortlichen, und Kalender wie Reporting sind wiederholbare Läufe. **Damit hängt das Wissen nicht an einem Kopf.** Der Betrieb hängt weiterhin an einer Person, solange es eine Person ist, und genau das ist die Entscheidung, die dann ansteht.

DANACH WAHR	GEMESSEN AN
Die Werkzeugentscheidung liegt begründet vor, und die Zahlen für die Kapazitätsfrage stehen auf dem Tisch.	Die Werkzeugentscheidung steht dokumentiert, egal in welche Richtung. Die Kapazitätsentscheidung ist gefallen, so oder so.

Der Datenweg

ZIEHEN STATT HOCHLADEN

Die Einheiten arbeiten weiter, wie sie heute arbeiten. Kein Portal, kein Pflichtfeld, kein Formular, keine Meldepflicht. Was gebraucht wird, wird geholt und passend gemacht, nicht bei ihnen bestellt.

> *Der Aufwand liegt bei mir, nicht bei ihnen. Das ist der ganze Unterschied zwischen einem Angebot und einer Vorgabe.*

01 **Abholen**

Genommen wird, was das System der Einheit ohnehin ausgibt: eine Kreditorenauswertung, eine Vertragsliste, ein Portalexport. In dem Format, in dem es kommt. Wer nichts hat, gibt nichts.

02 **Angleichen**

Lieferantennamen zu Konzernen zusammenführen, Währungen auf eine umrechnen mit Kurs und Stichtag, Zeiträume angleichen, konzerninterne Doppelzählungen heraus. Das ist die eigentliche Arbeit, und ohne sie ist jede spätere Auswertung falsch.

03 **Labeln**

Warengruppe in zwei Ebenen, Art des Vorgangs, Rolle am Vertrag. Regelbasiert zuerst, der Rest gekennzeichnet, wie er zugeordnet wurde. Ausgewiesen wird immer der Abdeckungsgrad, gemessen am Volumen, nicht an den Zeilen.

04 **Struktur**

Daraus entstehen genau zwei Sichten: ein Vertragsregister und eine Ausgabensicht. Aus ihnen fallen Verhandlungsvorbereitung, Fristenradar und die Übersicht je Einheit von selbst heraus. Keine dritte Sicht, keine vierte Ablage.

Der Rückkanal ist der Anreiz

Jede Einheit bekommt ihre eigene Auswertung zurück, bevor irgendjemand sonst sie sieht: ihre größten Lieferanten, ihre auslaufenden Verträge, die Konditionen, die sie mitnutzen könnte. Nur an sie, nie in einen Gruppenbericht. Das ist der Grund, warum beim zweiten Mal Daten kommen, ohne dass jemand fragen muss.

Solange nicht alle liefern, wird absolut berichtet, nie in Prozent. Der Nenner wächst mit. Eine Prozentzahl ohne Nenner wäre erfunden, und eine erfundene Zahl hält vor einem CFO genau eine Nachfrage lang.

Die Regeln über allem

GELTEN FÜR BEIDE SPUREN

> **Das Modell liest und schlägt vor. Deterministischer Code rechnet und prüft Schwellen. Ein benannter Mensch entscheidet.**

Eine Ausgabe ohne Fundstelle gilt als nicht vorhanden.
Jede Angabe trägt Seite und Klausel, damit die Kontrolle Sekunden dauert statt Minuten.

Keine Frist geht in den Kalender, die ein Mensch nicht an der Fundstelle bestätigt hat.
Nichts schreibt einen Anbieter an, nichts ändert einen Eintrag in einer Quellablage.

Quartalsweise eine Stichprobe gegen die Originale.
Die Trefferquote steht im Reporting. Wer die eigene Fehlerquote nicht misst, behauptet nur.

Der Vertrag eines Modellanbieters läuft nie durch dessen eigenes Modell.
Klingt nach einem Detail, ist aber die Frage, an der ein Sicherheitsarchitekt erkennt, ob jemand zu Ende gedacht hat.

> **Ein Modell, das unsere Verträge liest, ist ein Drittanbieter.** Der Halbsatz „es bleibt alles bei uns“ ist falsch und in fünf Sekunden zerlegt. Ehrlich ist: eigener Vertrag, Auftragsverarbeitung, Trainingsausschluss, geklärter Verarbeitungsort und Aufbewahrungszeitraum, und die Freigabe durch Security, bevor das erste Dokument läuft.

Was mit einer Person geht

UND WAS NICHT, AUSGESPROCHEN STATT VERSTECKT

Voll geliefert

Stufe 1 und 2, plus die beiden großen laufenden Verhandlungen. Das ist der erste Auftrag und die dringendste Vertragsarbeit.

In Grundform

Stufe 3 und 4: ein schlankes Reporting mit wenigen Kennzahlen, ein Prozess auf einer Seite. Ausgebaut wird beides erst, wenn der Betrieb trägt.

Langsamer

Stufe 5: zwei bis drei Einheiten im Jahr statt aller, priorisiert nach Volumen und danach, wer will.

Bleibt liegen

Das Backlog wird sortiert und nur die Spitze abgearbeitet. Proaktive Kategoriearbeit in der Breite entfällt. Dauerhaft betrieben wird höchstens ein Agent.

Kommt eine zweite Person, übernimmt sie den Betrieb, also Kalender, Reporting und Standardfälle, und die Arbeit mit den Einheiten läuft parallel statt nacheinander.

> *Dass ich selbst sage, was nicht geht, ist belastbarer als jede Zusage.*
